

工程表マニュアル（工事一覧）

- 1 メニューから工事のアイコンを選択し、開いた画面から 工事一覧をクリックします。



- 2 工事一覧が表示されます。



- ③ 工事詳細から工程表の開始日と終了日を記入します。



- ④ 工事詳細が表示されます。下にスクロールします。



- ⑤ 業務情報までスクロールします。

業務情報					
営業担当:	秋山 美穂	工事担当:	斉藤 一馬		
設計担当:	松田 由美子	IC担当:			
契約日:	2022/09/06	図面確定日:	年 / 月 / 日	事前承認日:	年 / 月 / 日
現調日:	年 / 月 / 日	設計監理契約日:	年 / 月 / 日	本承認日:	年 / 月 / 日
地鎮祭		着工日	上棟日		
予定:	年 / 月 / 日	予定:	2022/11/18	予定:	2023/11/24
実績:	年 / 月 / 日	実績:	年 / 月 / 日	実績:	年 / 月 / 日
完工日		引渡日			
予定:	2023/02/02	予定:	2024/02/16		
実績:	年 / 月 / 日	実績:	年 / 月 / 日		
工期	0 日				
工事概要					

- ⑥ 【地鎮祭 予定】 【引渡日 予定】 に、開始と終了の日付を入力します。


地鎮祭(工程表開始日) ← 工程表の開始となる日

予定:	2024/06/08	📅
実績:	年 / 月 / 日	📅

引渡日(工程表終了日) ← 工程表の終了となる日

予定:	2024/10/31	📅
実績:	年 / 月 / 日	📅

- ⑦ 上に戻って、右上の **登録** をクリックし、画面上に出てくるメッセージに OK をクリックし **×** で閉じます。

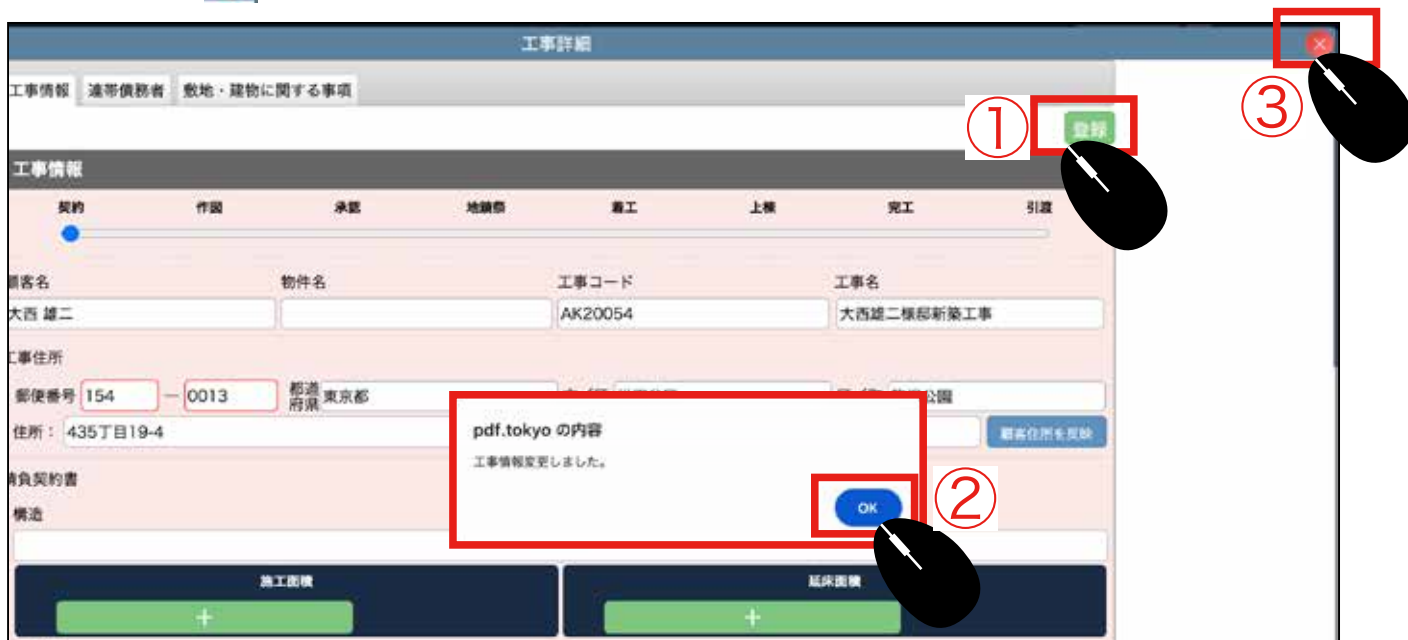


- ⑧ 一覧が表示されます。



① 工事一覧から、工程表のアイコンをクリックします。



工程表が未作成の場合、赤い枠



工程表が作成済の場合、枠なし

② 未作成の工程表が表示されます。



【各箇所の機能】

実行予算・実行予算 GC で工事を紐付けている場合、実行予算の項目を読み込みます。

工程表の表示期間を選択
印刷範囲の選択期間にもなります。

テンプレート読み込み

使用: テンプレートリスト 関連見積: 未設定

工程表の大項目を選択
複数選択可能

工程表レイヤーを
複数作成可能

列幅を設定
デフォルトは 30
最大 40

表の中の文字表示の
ON / OFF

③ 右上部の表示期間を指定します。

工 期: ~

完成日(予): 年 / 月 / 日 引渡日(予): 2024/04/30

完成日(実): 年 / 月 / 日 引渡日(実): 年 / 月 / 日

工程表期間: 2024/02/01 ~ 2024/04/30

列幅: 40 表示:

2月

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
先	友	先	仏	大安	赤	先	友	先	仏	大安	赤	先	友	先	仏	大安
勝	引	勝	滅		口	勝	引	勝	仏		口	勝	引	勝	仏	


表示と印刷の開始日


工程表期間: 2024/02/01

表示と印刷の終了日

~ 2024/04/30

※印刷の方法は P20 ~に記載があります。

④ 左下の  をクリックして工程表の新規行を作ります。



⑤ 行が追加されます。追加された行をダブルクリックします。

主 所：
工事区分：未設定 施主様：
地鎮祭(予)：2024/02/01 着工日(予)：年/月/日 上棟日(予)：年/月/日
地鎮祭(実)：年/月/日 着工日(実)：年/月/日 上棟日(実)：年/月/日
使用：テンプレートリスト 関連見積：未設定 工程表期間：
工種：●未設定 全レイヤー 列幅：

西沢様邸新築工事

住 所：
工事区分：未設定
施 主：
工 期：2024-02-01~2024-04-30

未設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	先負	仏減	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏減	大安	先勝	友引	

未設定

A screenshot of a software interface showing a table with a row highlighted in grey. A red box highlights the highlighted row, and a larger red box highlights a larger version of the same row that appears to be a tooltip or a larger view of the row. A black mouse cursor is pointing at the larger row.

マウスをあてると背景がグレーになります。
その時ダブルクリックします。

- ⑥ 設定画面が開きます。項目名称に工程名を入力します。



項目設定

項目名称：
未設定

取引会社：

工種： 工種


業者： 業者名 電話：

担当者： メンバー 電話：

休み日：

日	月	火	水	木	金	土	祝
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

続いてこの工程のバーの色を選択します。工程ごとに色を分けた方が見やすくなります。赤いバーをクリックします。カラーピッカーが表示されます。



バー色：

項目追加


開始 終了 報告

255 0 0
R G B

- 7 色を選択し確定をクリックすると画面は閉じます。



- 8 仮設工事という工程ができました。この項目の下に詳細な工程を入力する場合は子項目を追加します。 仮設工事の行の部分再度ダブルクリックします。

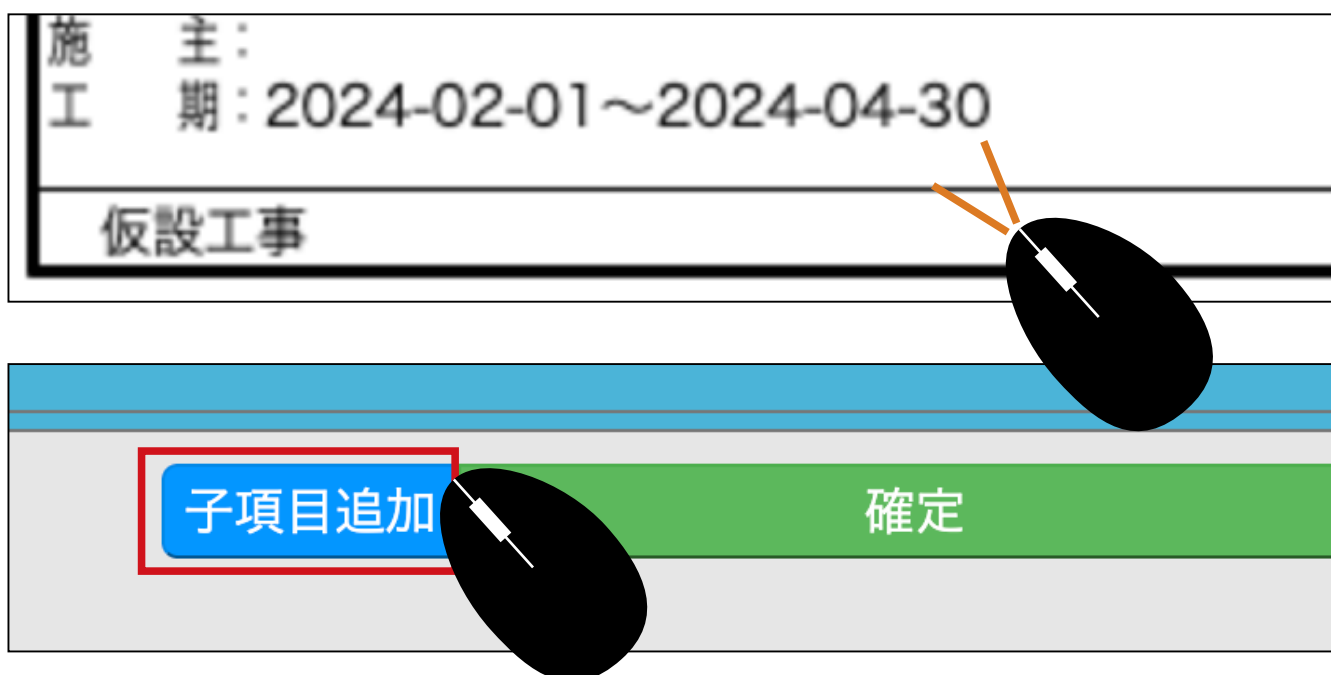

真ん中あたりの子項目追加ボタンをクリックします。

⑨ 画面の左側にすでに子項目が作成されました。確定で閉じます。

西沢様邸新築工事

住所：未設定
工事区分：未設定
施工主：未設定
工期：2024-02-01～2024-04-30

1
木
先負

日 月 火 水 木 金 土 日

✓ □ □ □ □ □ ✓ ✓

バー色：

削除 子項目追加 確定

工事内容：

できた子項目を開きます。 未設定の行をダブルクリックします。

施工主：未設定
工期：2024-02-01～2024-04-30

仮設工事

未設定

項目名称を入力します。

項目設定

項目名称：
未設定

取引会社：

工種： 工種

業者： 業者名 電話：

担当者： メンバー 電話：

休み日：

日 月 火 水 木 金 土 祝

✓ □ □ □ □ □ ✓ ✓

- ⑩ 入力し終わったら確定をクリックして閉じます。

項目設定 ×

項目名称：
足場

取引会社：

工 種：

業 者： 電 話：

担当者： 電 話：

休み日：



■ バーを引いて詳細な情報を入力する

表の中にバーを引きます。 マウスで大項目の仮設工事から線を引きます。マウスの左ボタンを押したまま予定日からおおよその終了日までを移動するとバーが出来ます。大項目の工数は小項目の合計日数になるため、この時点ではおおよその日数にします。大項目だけの工程表であれば決まった日付まで線を引きます。

①


西沢様邸新築工事		2月																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
住 所： 工事区分：未設定 施 主： 工 期：2024-02-01~2024-04-30		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
-仮設工事		[Red bar spanning from Feb 1 to Feb 14]																		
足場		[Red bar spanning from Feb 1 to Feb 14]																		

西沢様邸新築工事		2月																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
住 所： 工事区分：未設定 施 主： 工 期：2024-02-01~2024-04-30		先負	仏減	大安	赤口	先勝	友引	先負	仏減	大安	先勝	友引	先負	仏減	大安	赤口	先			
-仮設工事		[Blue bar with red diagonal lines from Feb 1 to Feb 14]																		
足場		[Blue bar with red diagonal lines from Feb 1 to Feb 14]																		

② 子項目にも同様に開始日と終了日にバーを引きます。

所:		1	2	3	4	5
区分: 未設定		木	金	土	日	月
主:		先負	仏滅	大安	赤口	先勝
期: 2024-02-01~2024-04-30						
反設工事	●	14.5日		1.5日		
足場	●	14.5日		1.5日		

③ 子項目のバーをダブルクリックします。

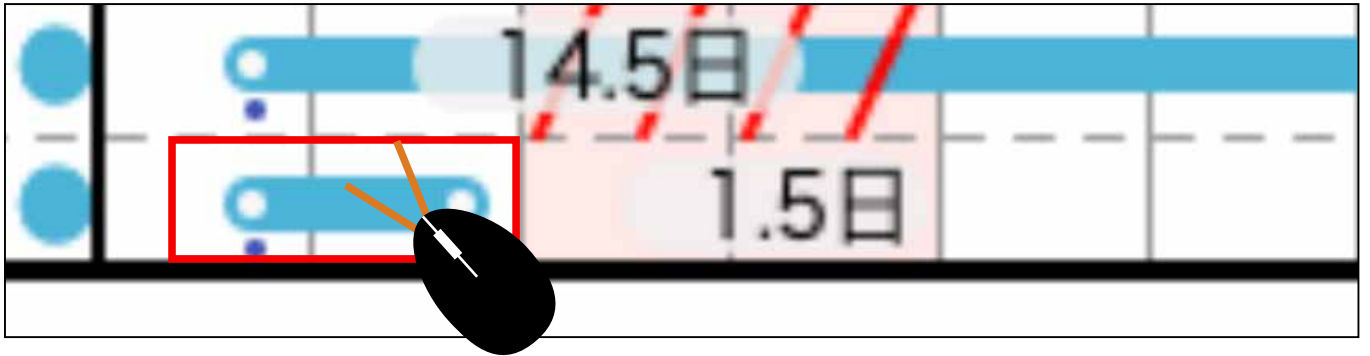

バー設定

名称

工事期間
開始日: 2024/02/01 午後 完了日: 2024/02/02 午後

取引会社
工種: 工種
業者: 中央青山工業 電話: 03-6264-8316
担当者: 松山 義男 電話: 03-6264-8316
レイヤー: 全レイヤー 関連項目: 項目

進捗

休み日

日	月	火	水	木	金	土	祭
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

バー色

削除 確定

子項目のバーの設定画面が開きます。

休日のデフォルトが土日祝になっているので、適正な休みにしてください。休みを差し引いた工数をバーが自動計算します。

④ 発注先が決定している場合は、設定します。

取引会社

工種： 工種

業者： 中央青山工業 電話： 03-6264-8316

担当者： 松山 義男 電話： 03-6264-8316

レイヤー： 全レイヤー 関連項目： 項目

確定をクリックして保存します。

削除 確定

工種マスター、協力会社マスター、協力会社担当の設定がされていれば表示されます。

- ・ 工種マスター（メニュー>設定>工種マスター）
- ・ 協力会社マスター（メニュー>設定>協力会社詳細）
- ・ 協力会社の担当者（メニュー>設定>協力会社の担当者>担当者一覧>）


⑤ この要領で工程を全て登録します。（時間がかかる場合は、まめに左下の保存ボタンをクリックし保存しながら行ってください。）

養生期間									
脱型									
埋戻 外周砂利敷き									
玄関ポーチ下打ち									
外部埋設配管									

保存

※テンプレートから作る工程表は P16 ~


- ⑥ 内容の入力が終わったら、日数などを調整します。子項目の最初と最後のバーをずらすと、大項目の予定日も自動でずれます。

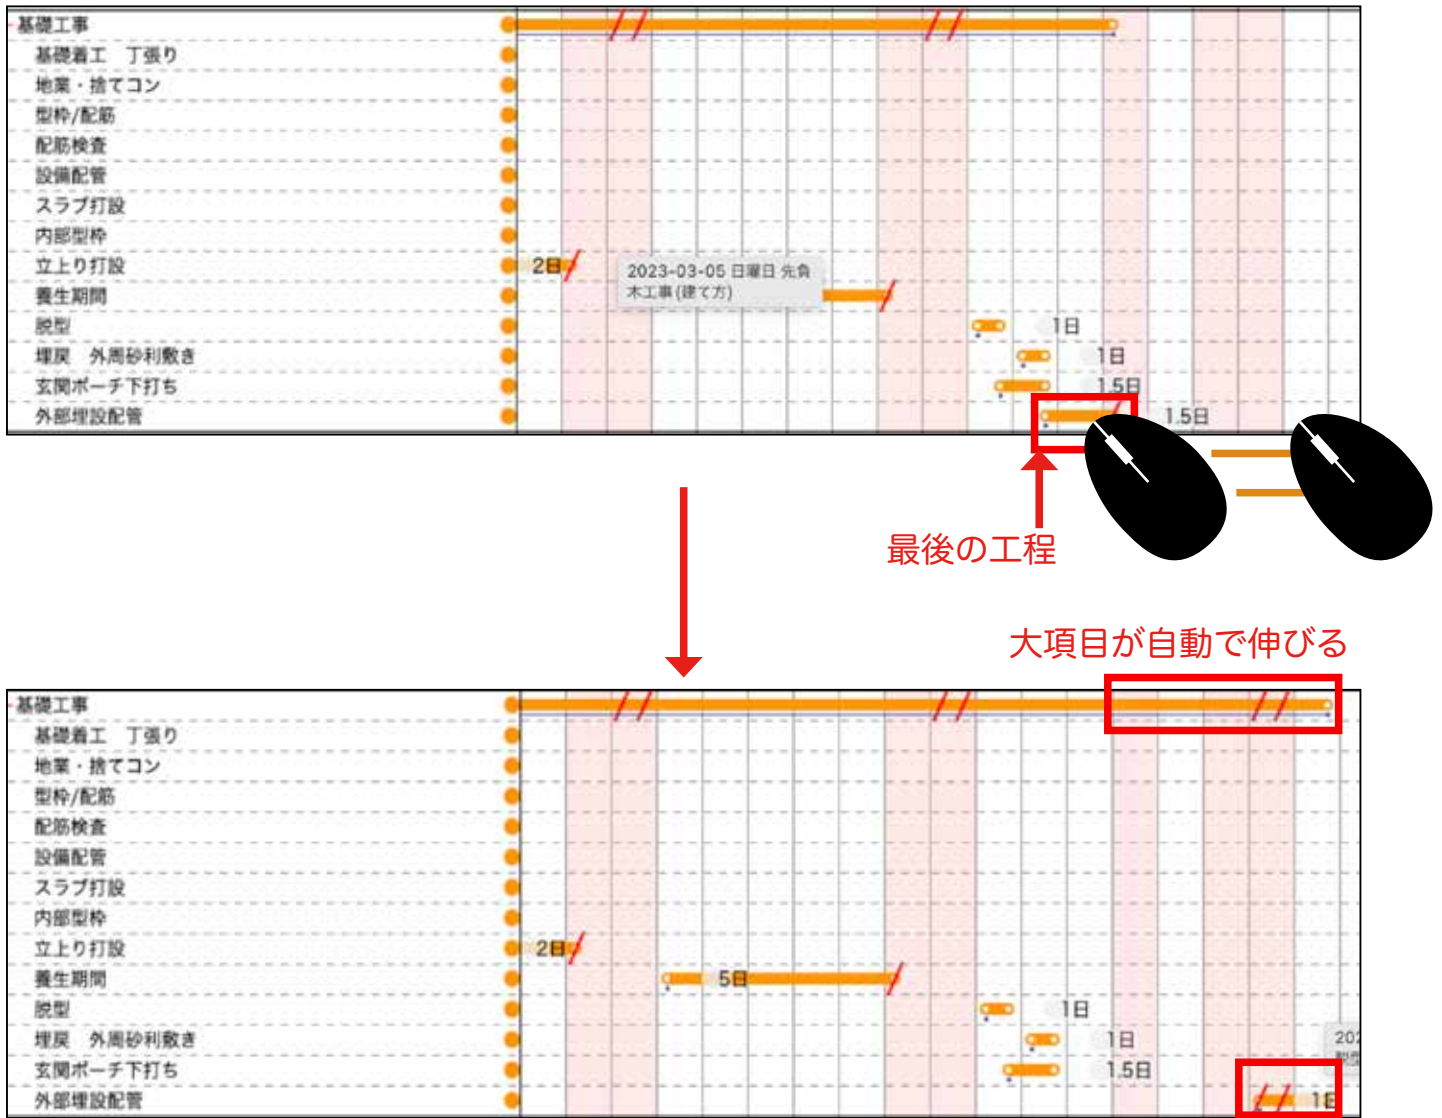

- ⑦ 大項目の同列にいくつも工程を登録できます。横並びにバーを引いてください。



⑧ 左下の保存をクリックして閉じます。

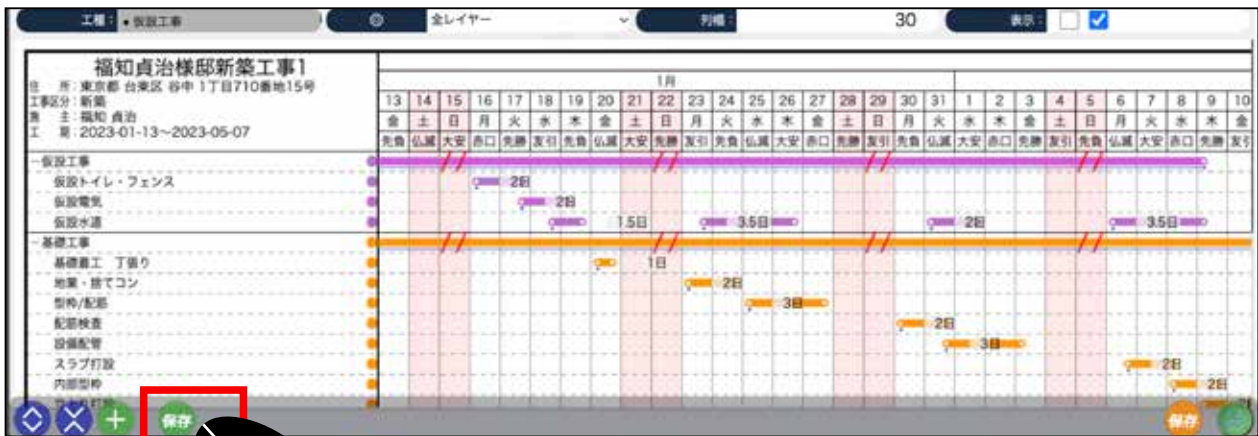

⑨ 作成した工程表をテンプレートとして保存する場合は、右下の保存をクリックします。



テンプレートの名称を入力してOKをクリックします。

pdf.tokyo の内容

テンプレート名を入力してください。

キャンセル OK

工程表新規作成（テンプレートから作成）

- 1 工事一覧から、工程表のアイコンをクリックします。（P2～P4の作業が済んでいる場合）



工程表が未作成の場合、赤い枠



工程表が作成済の場合、枠なし

- 2 未作成の工程表が表示されます。

西沢様邸新築工事		2月																																	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
作業	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	

【各箇所の機能】

テンプレート読み込み

実行予算・実行予算 GC で工事を紐付けている場合、実行予算の項目を読み込みめます。

工程表の表示期間を選択印刷範囲の選択期間にもなります。

The screenshot shows a project management interface with the following elements highlighted by red lines:

- テンプレート読み込み:** Points to the '使用: テンプレートリスト' dropdown menu.
- 実行予算・実行予算 GC で工事を紐付けている場合、実行予算の項目を読み込みめます。:** Points to the '実運見積: 未設定' dropdown menu.
- 工程表の表示期間を選択印刷範囲の選択期間にもなります。:** Points to the '工程表期間: 2024/02/01 ~ 2024/04/30' date range selector.
- 工程表の大項目を選択複数選択可能:** Points to the '工種' dropdown menu.
- 工程表レイヤーを複数作成可能:** Points to the '全レイヤー' dropdown menu.
- 列幅を設定デフォルトは30最大40:** Points to the '列幅: 30' input field.
- 表の中の文字表示のON/OFF:** Points to the '表示:

工程表の大項目を選択複数選択可能

工程表レイヤーを複数作成可能

列幅を設定
デフォルトは30
最大40

表の中の文字表示のON/OFF

③ 右上部の表示期間を指定します。

This view shows the date selection process in detail:

- The '工程表期間' (Project Schedule Period) is set to '2024/02/01 ~ 2024/04/30'.
- The '列幅' (Column Width) is set to '40'.
- The '表示' (Display) checkbox is checked.
- A calendar for February is shown below, with the start date '10' (Feb 10) and end date '26' (Feb 26) highlighted.

表示と印刷の開始日

工程表期間: 2024/02/01

表示と印刷の終了日

~ 2024/04/30

④ 左上部のテンプレートリストをクリックして選択します。

地鎮祭(実) :	年 / 月 / 日	
完成日(予) :	年 / 月 / 日	
完成日(実) :	年 / 月 / 日	
使用	▼	×
工種	▼	

✓ テンプレートリスト

ABC(株)新築工場

テンプレート A

リフォームテンプレート

外壁・屋根工事

標準工程表 A

住 所 :	
工事区分 : 未設	
施 主 :	

(テンプレートの登録方法は P15)

※テンプレートを登録するには一度は手入力で登録する必要があります。)

⑤ テンプレートを選択して左横の使用をクリックします。

地鎮祭(実) :	年 / 月 / 日	<input type="checkbox"/>		
完成日(予) :	2024/05/17	<input type="checkbox"/>		
完成日(実) :	年 / 月 / 日	<input type="checkbox"/>		
使用 :	標準工程表A	▼	×	関連見積
工	テンプレート読み込み			⚙️


吉田淳様新築工事

住 所 : 東京都 千代田区 外神田 302丁目52-71


工事区分 : 新築

17

- ⑥ 読み込んだテンプレートが表示されますので、左下の保存をクリックします。

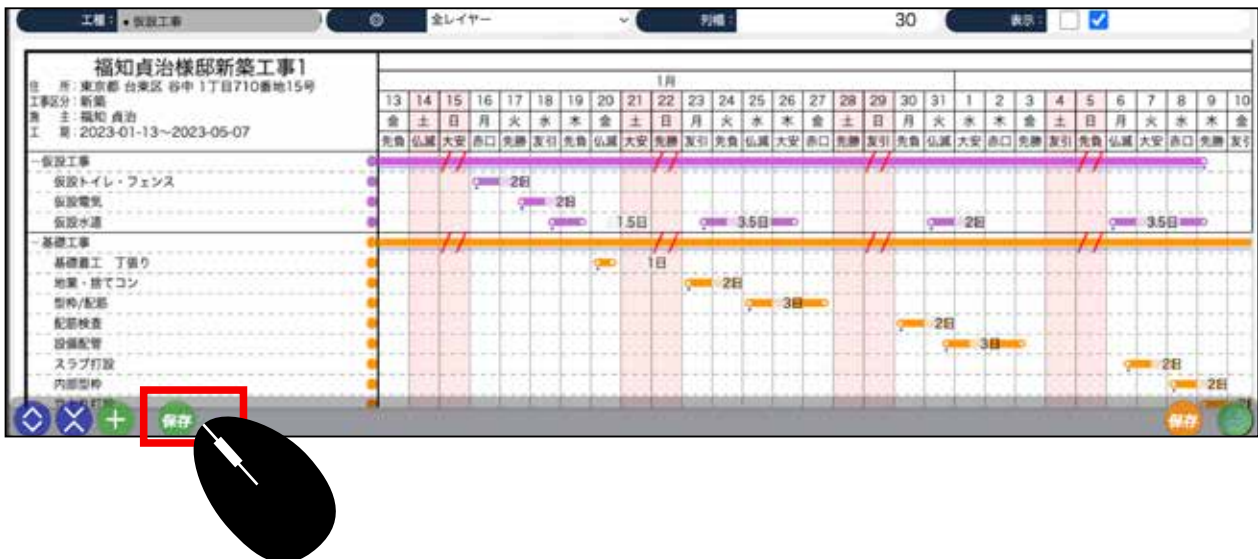

- ⑦ 工数や詳細などを編集して保存してください。

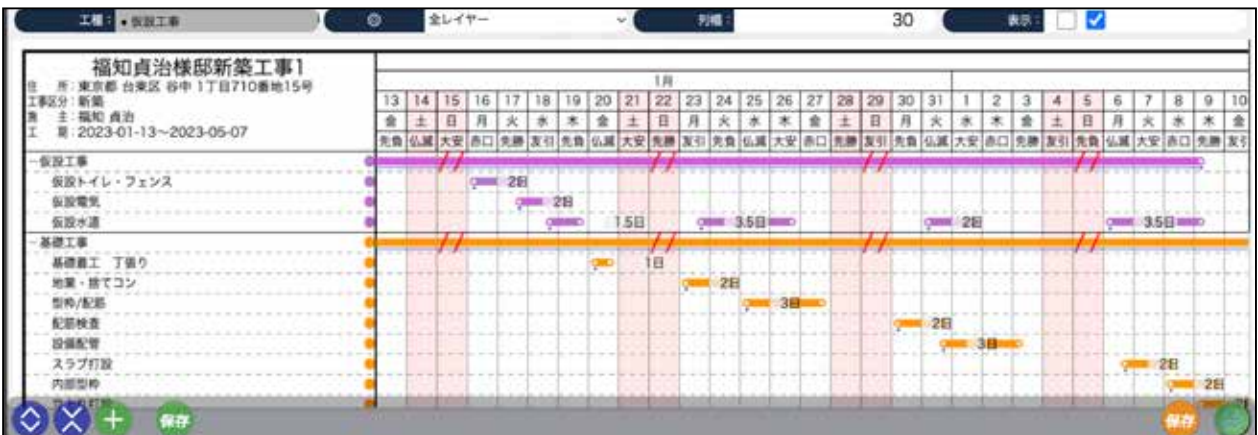

■ テンプレートの削除

削除したいテンプレートを選択した状態で右の赤いXをクリックします。

The screenshot shows a form with the following fields:

- 地鎮祭(実): 年 / 月 / 日
- 完成日(予): 2024/05/17
- 完成日(実): 年 / 月 / 日

At the bottom, there is a section for template selection:

- 使用: 標準工程表A
- 関連見積: [Red X button]

A red box highlights the '標準工程表A' option, and another red box highlights the red X button next to it. A mouse cursor is pointing at the X button.

■ 工程表の印刷

- ① 工事一覧から、工程表のアイコンをクリックします。（工程表が作成されている場合）



- ② 右上部の表示期間を指定します。

工 期：～

完成日(予)：年 / 月 / 日 引渡日(予)：2024/04/30

完成日(実)：年 / 月 / 日 引渡日(実)：年 / 月 / 日

工程表期間：2024/02/01 ~ 2024/04/30

列幅： 40 表示：

2月

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
安	休	引	休	休	休	休	引	休	休	休	休	引	休	休	休	休

印刷の開始日

工程表期間：2024/02/01

印刷の終了日

~ 2024/04/30

③ 工程表期間の選択をした後、右下の緑のアイコンをクリックします。



福知貞治様邸新築工事1
住所: 東京都台東区谷中1丁目710番地15号
工事区分: 新築
業主: 福知 貞治
工期: 2023-01-13~2023-05-07

1月
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

仮設工事
仮設トイレ・フェンス
仮設電気
仮設水道

基礎工事
基礎掘削 丁張り
地盤・捨てコン
型枠/配筋
配筋検査
設備配管
スラブ打設
内部型枠

保存

④ 工程表が表示されます。右上のプリントで印刷します。



福知貞治様邸新築工事1

印刷

プリント
